

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys



ÀMBIT D'OBRA

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

Xarxa actual que ha arribat al
final de la seva vida útil




XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

Renovació 249 m xarxa aigua potable existent per canonades de FD de diferents diàmetres: 100, 200 i 250 mm.

Renovació 134 m xarxa reg existent per una canonada de FD de diàmetre 150 mm per la vorera.

Renovació d'hidrants, vàlvules, ventoses i descàrregues.

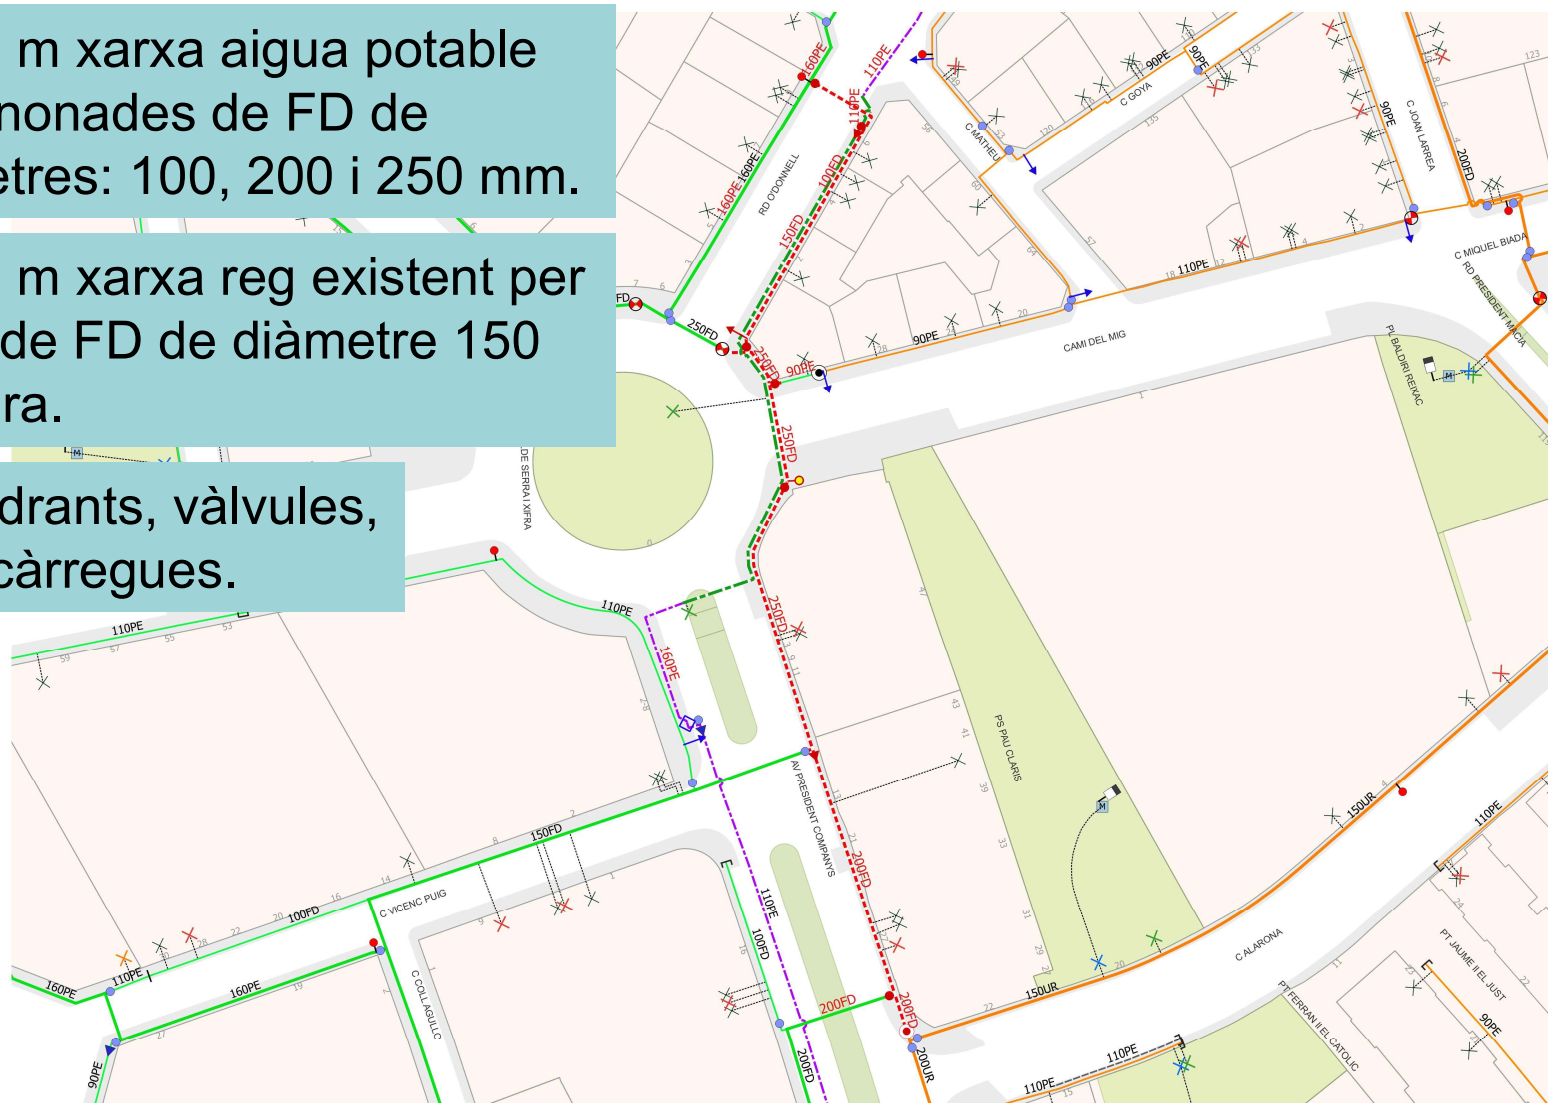


XARXA D'AIGUA POTABLE DE PROJECTE

Aigües de Mataró

[illegible]

XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

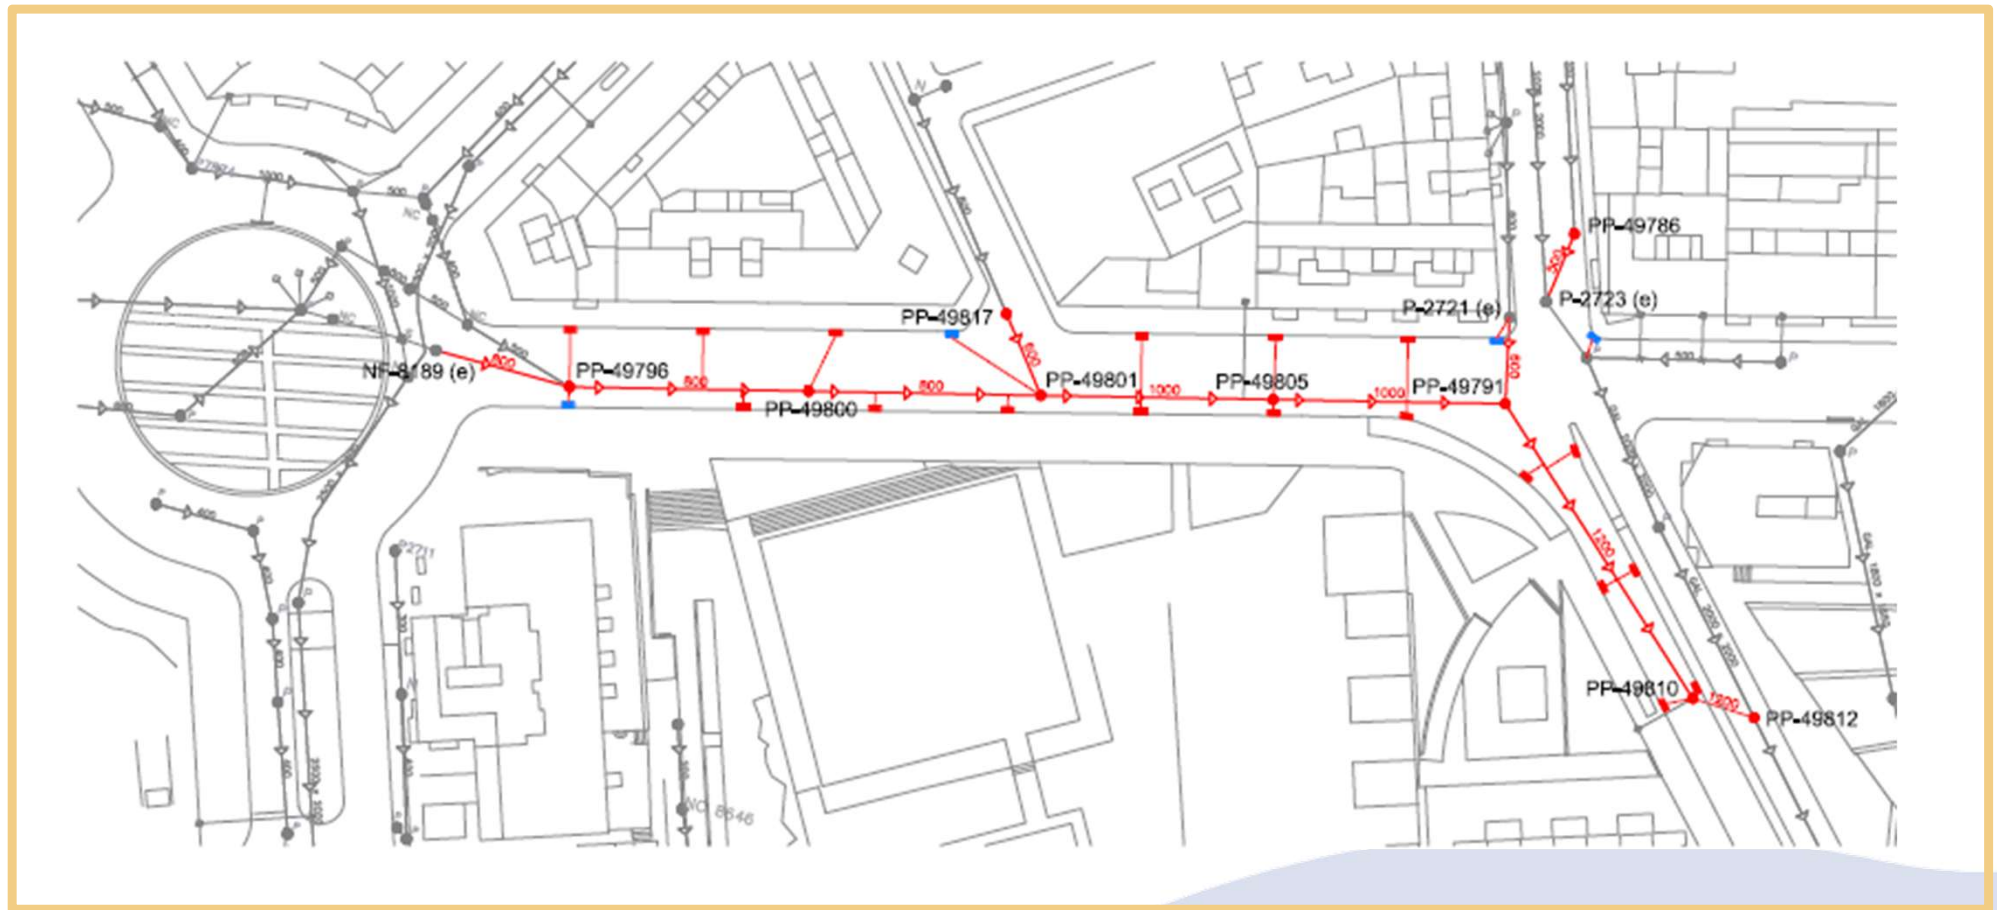


XARXA DE CLAVEGUERAM DE PROJECTE

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

CALENDARI EXECUCIÓ DE L'OBRA																												
ACTIVITATS	AGOST 2025				SETEMBRE 2025				OCTUBRE 2025				NOVEMBRE 2025				DESEMBRE 2025				GENER 2025				FEBRER 2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE 1 JOAN LARREA (CLAV.)																												
FASE 2.1 RD. FRANCESC MACIA (CLAV.)																												
FASE 2.2 RD. FRANCESC MACIA (CLAV.)																												
FASE 3 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)																												
FASE 4 ALCALDE XIFRA (CLAV.)																												
FASE 1 RD. O'DONELL (AIGUA)																												
FASE 2 ALCALDE XIFRA (AIGUA)																												
FASE 3 AV. LLUÍS COMPANYS (AIGUA)																												
TREBALLS PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ																												

Inici de les obres	4 d'agost 2025
Termini d'execució	25 setmanes

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

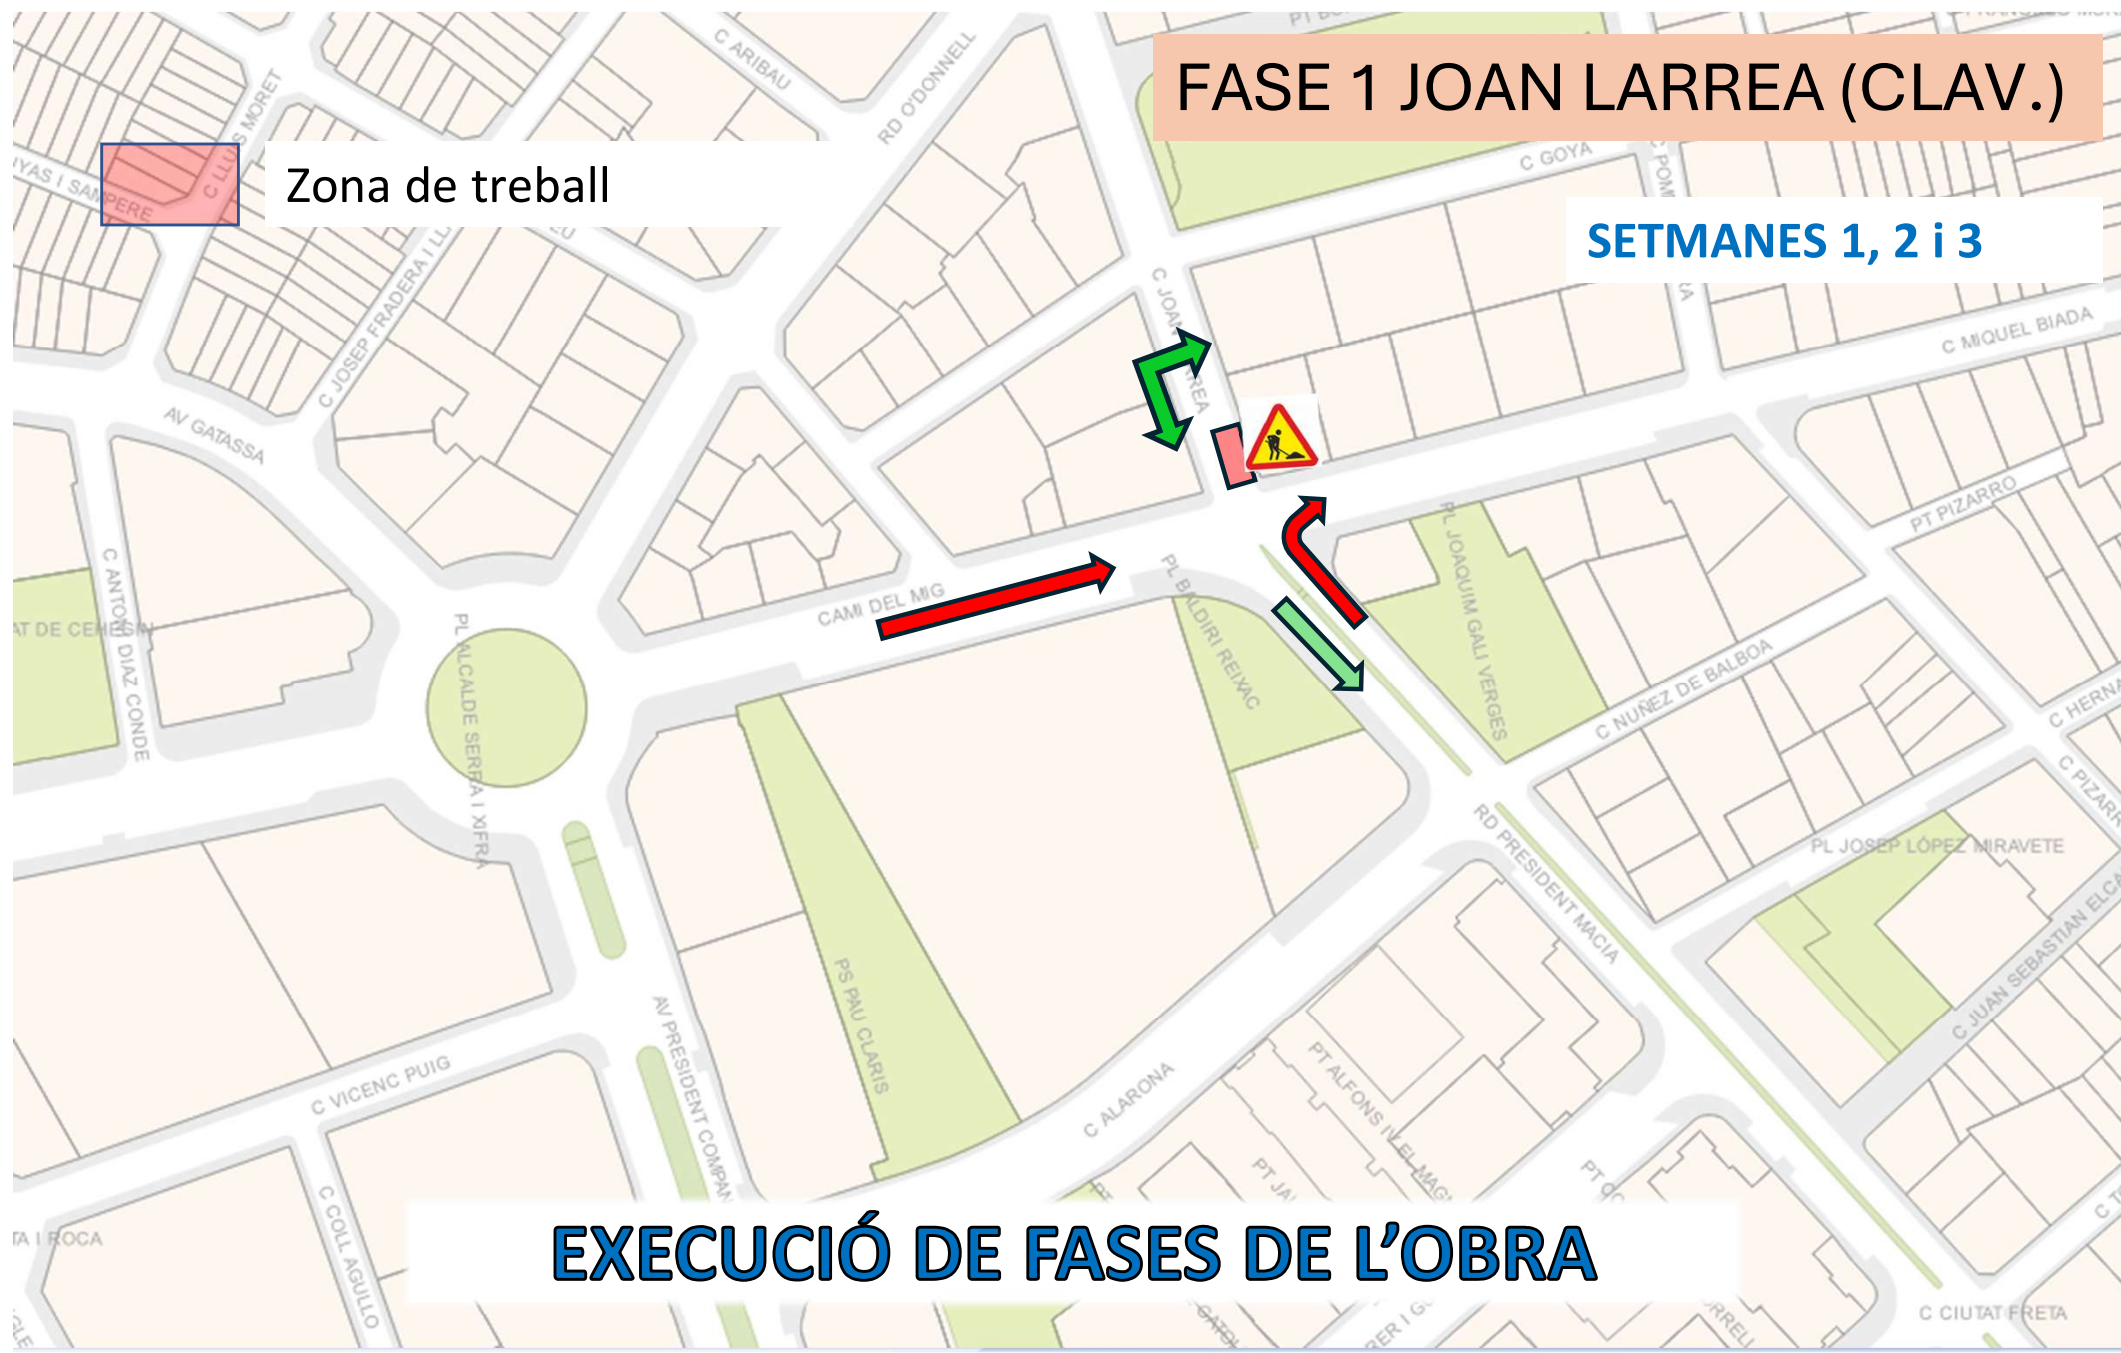


Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

FASE 2.1 RD. FRANCESC MACIÀ (CLAV.)


SETMANES 4, 5 i 6

 Zona de treball

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

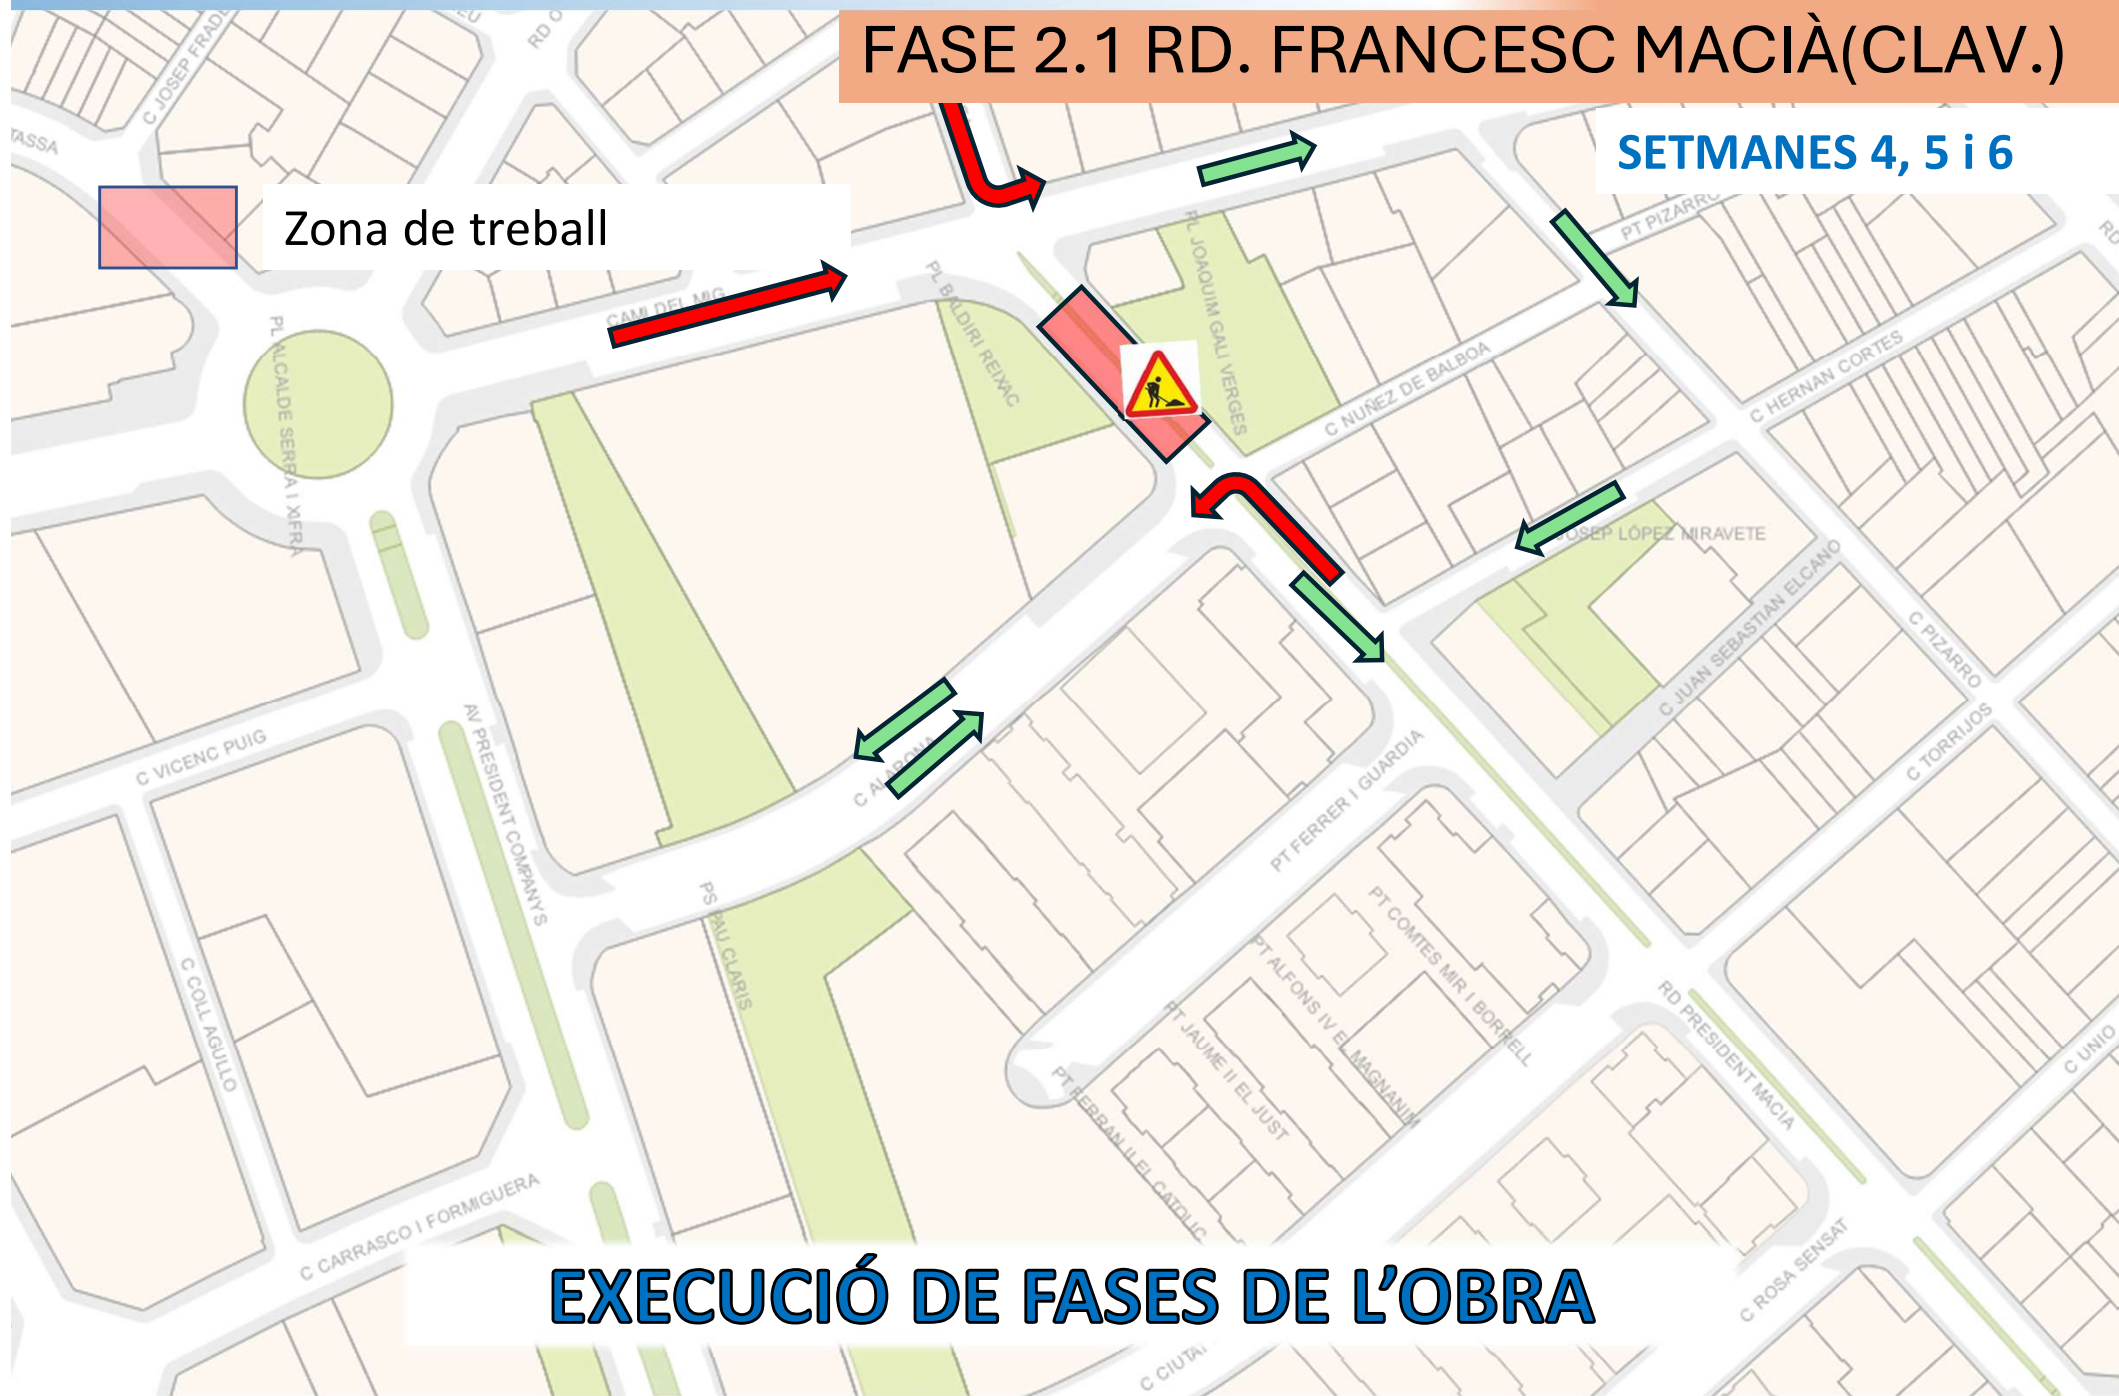

SETMANES 4, 5 i 6

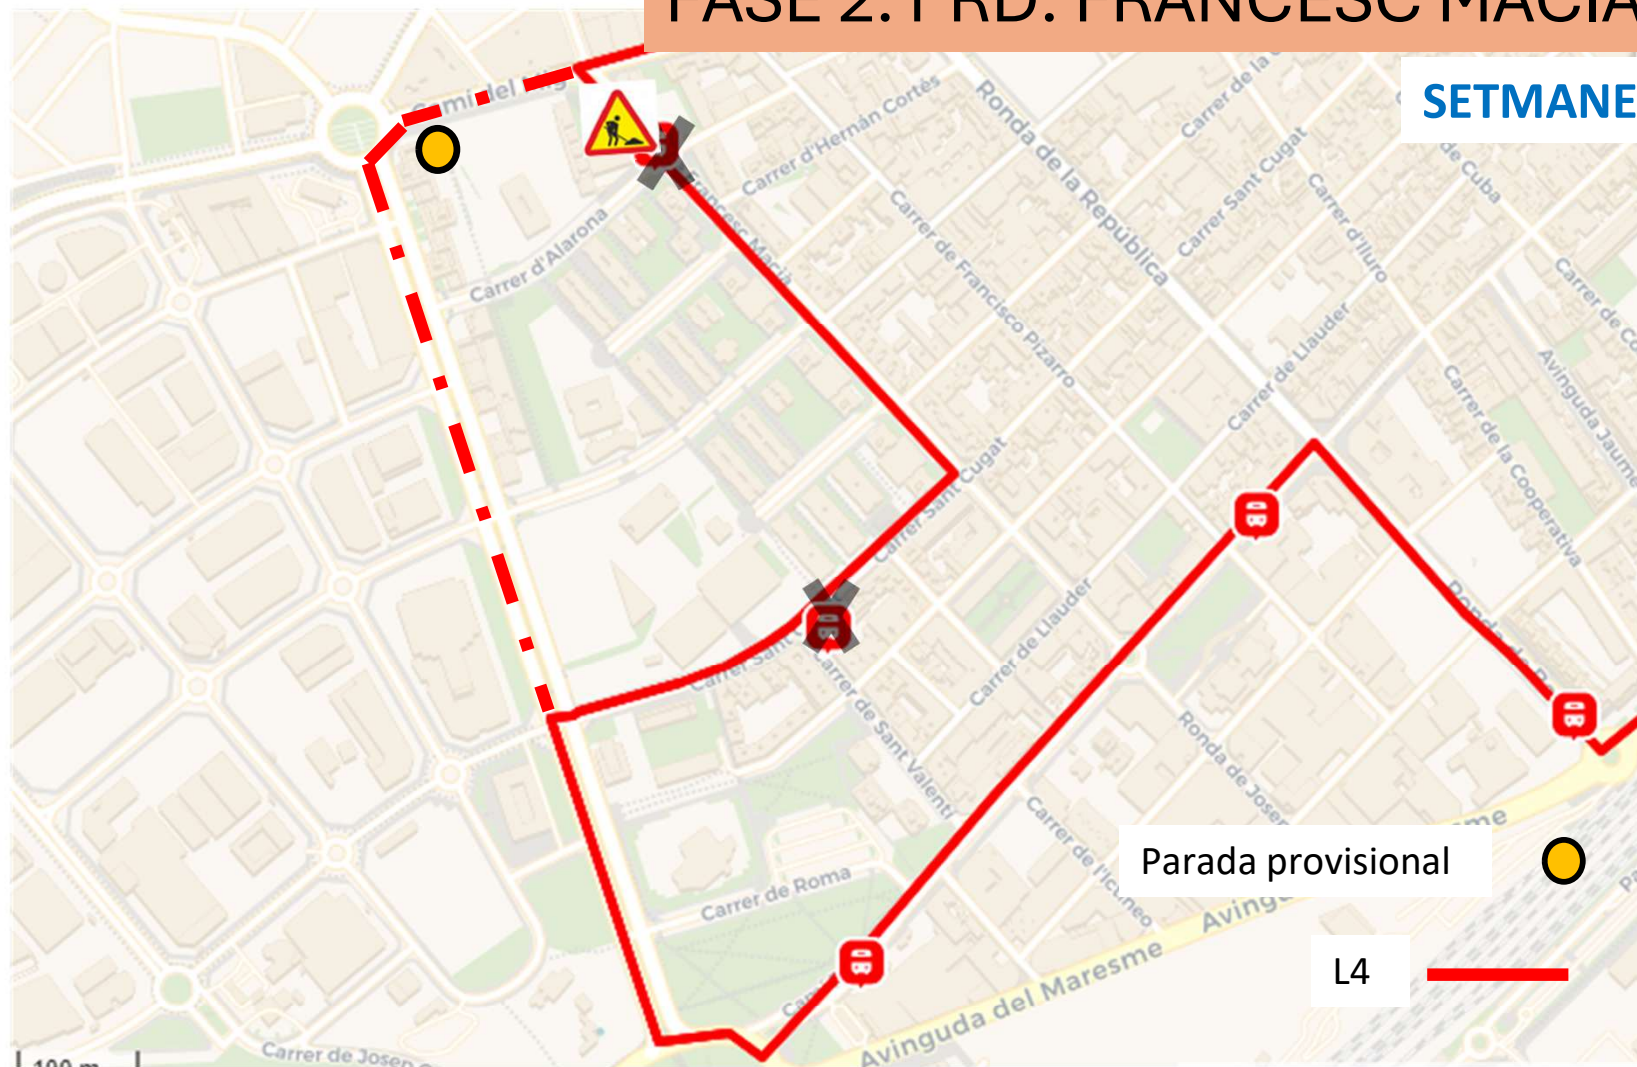


AFECTIONÓ BUS

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

FASE 2.2 RD. FRANCESC MACIÀ (CLAV.)

SETMANES 6 a 10

 Zona de treball

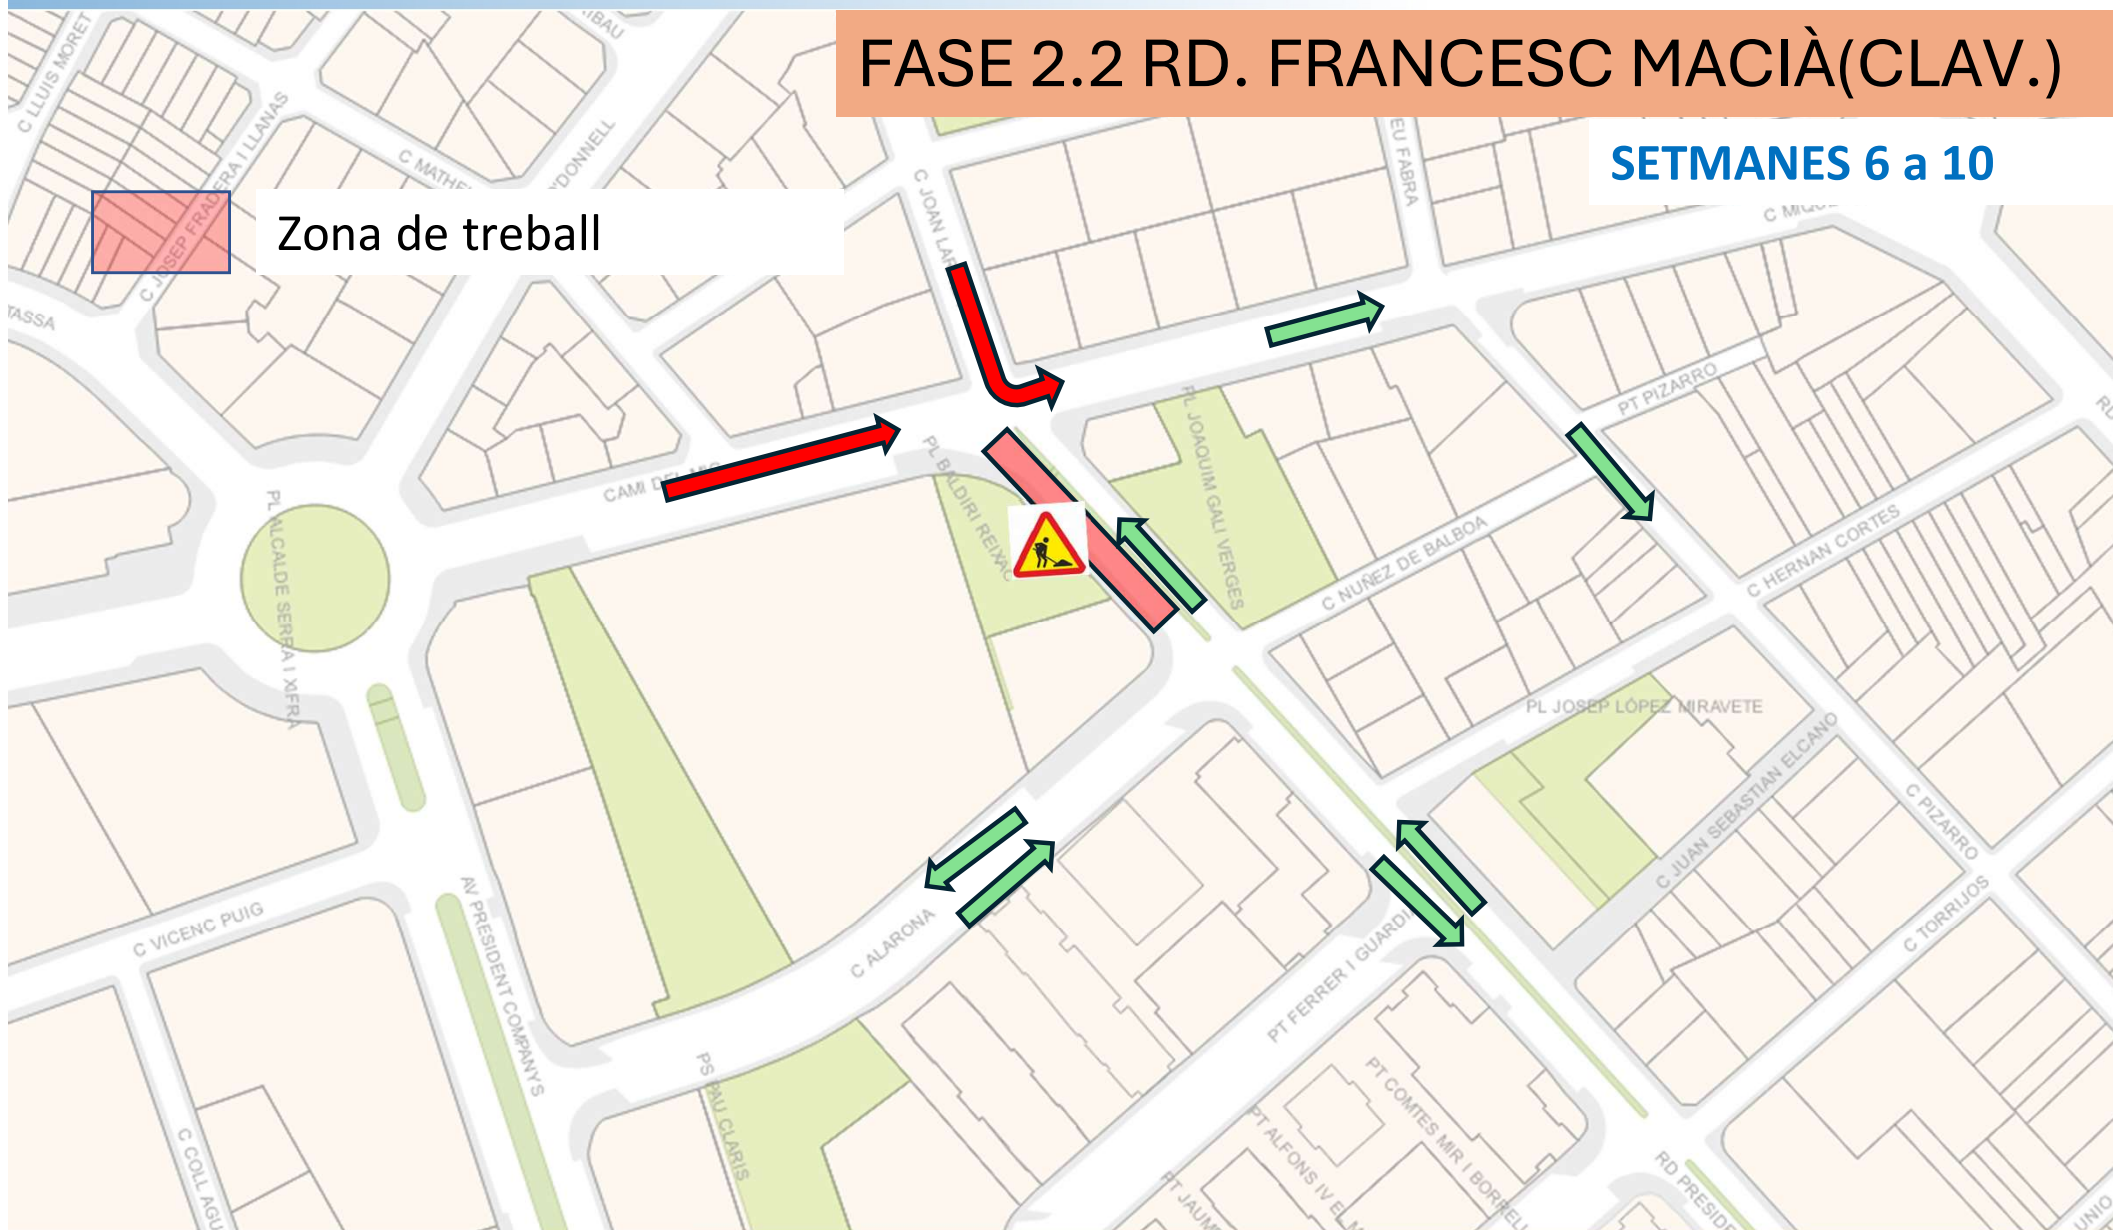

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Aigües de Mataró

FASE 3 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)

FASE 1, 2 i 3 RD. O'DONNELL i AV. LLUÍS COMPANYS (AIGUA)

SETMANES 11 a 22

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

FASE 3 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)

**FASE 1, 2 i 3 RD. O'DONNELL i AV. LLUÍS
COMPANYS (AIGUA)**

SETMANES 11 a 22



AFFECTACIÓ BUS

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys


FASE 3 AV. LLUÍS COMPANYS (AIGUA)

FASE 4 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)

SETMANES 23 i 24



Zona de treball

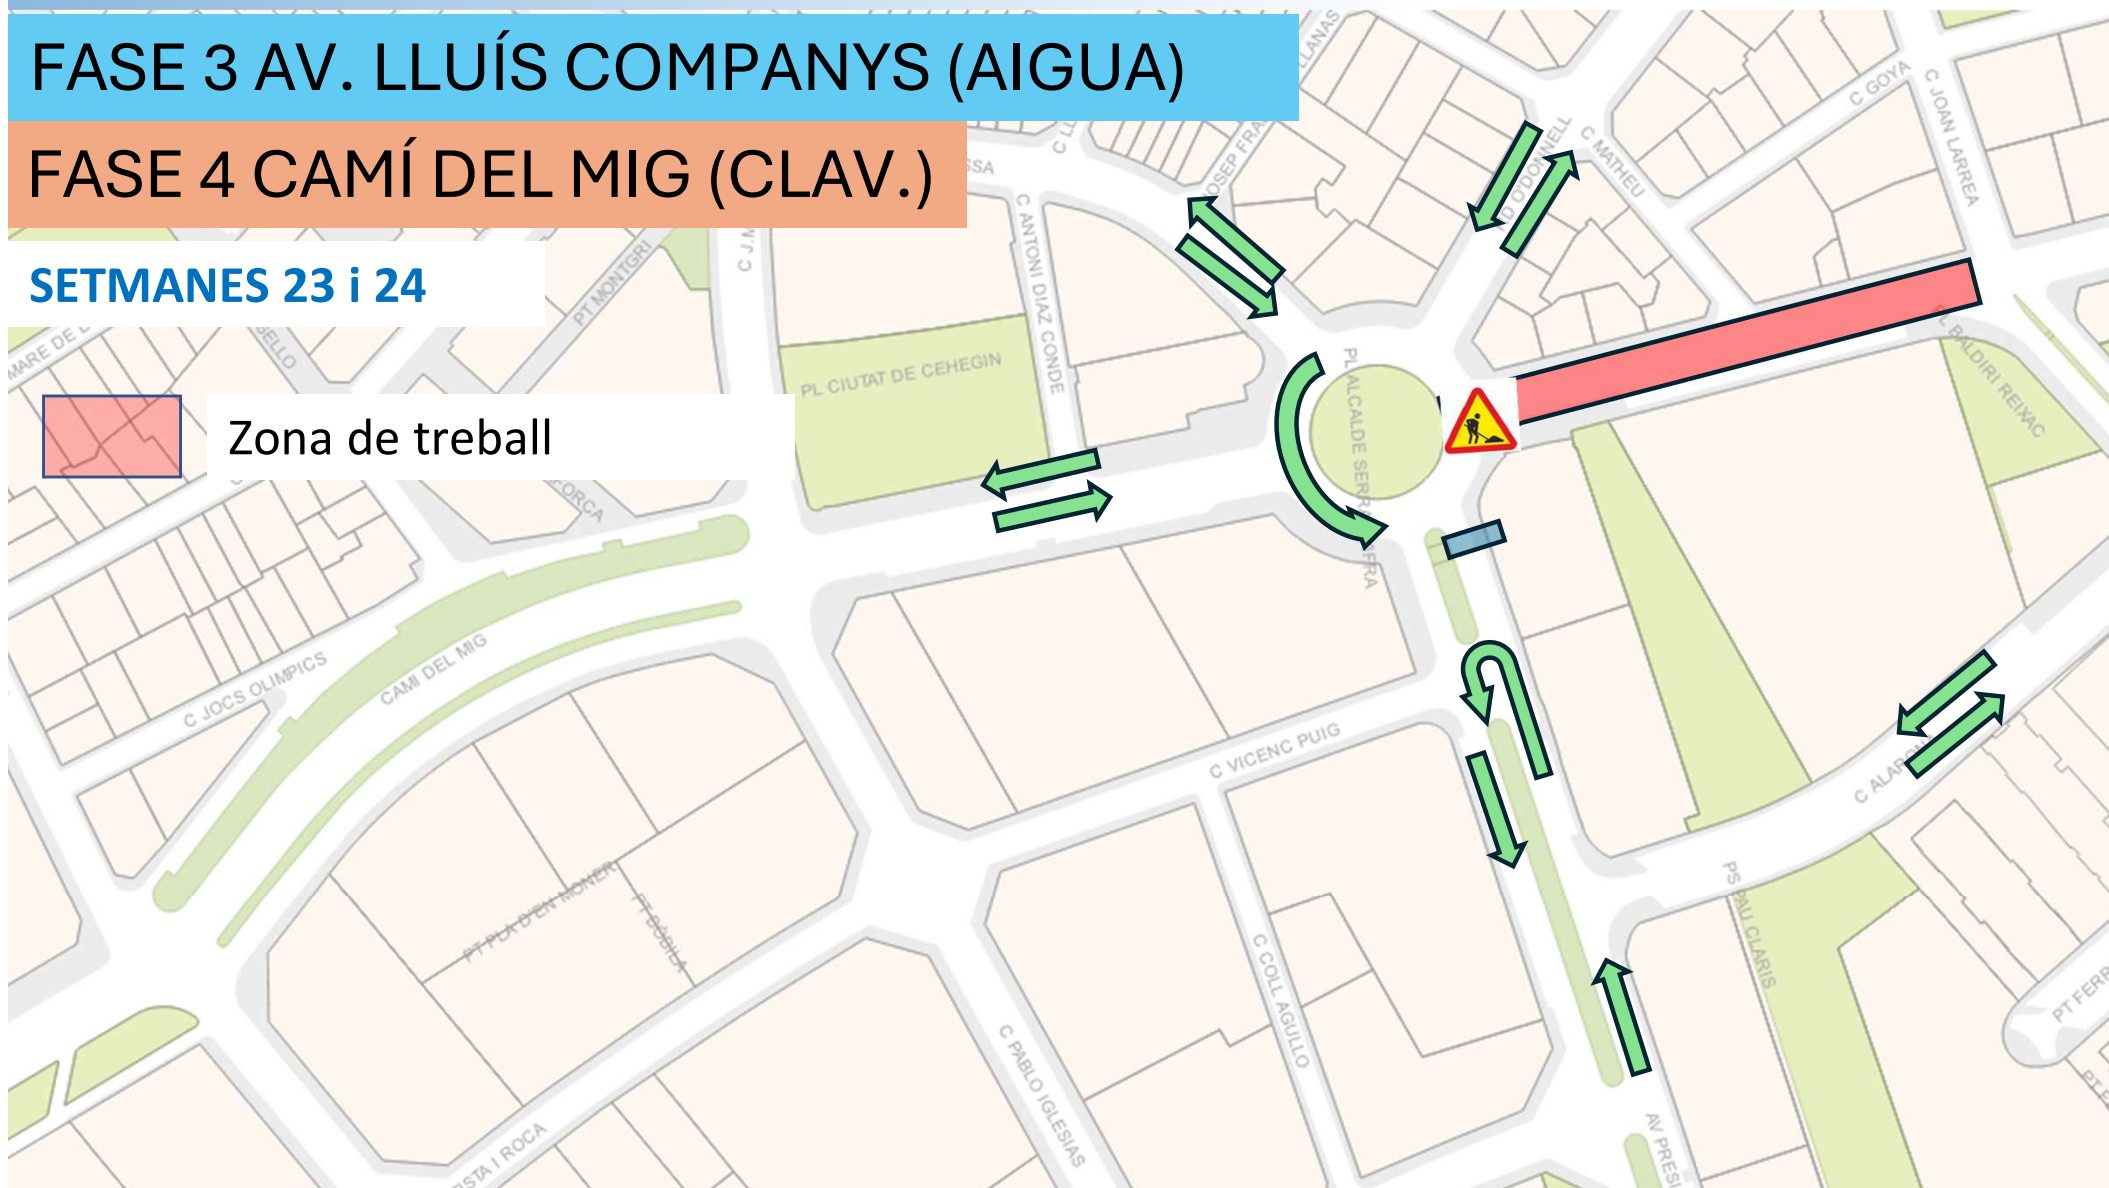

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

FASE 4 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)

L7

AFECTIONÓ BUS

FASE 4 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)

A detailed map of the Camí del Mig area in Barcelona. The map shows a network of streets including Carrer de Ramon Berenguer III, Carrer de Matheu Domènech, Carrer de Francisco de Goya, Carrer d'Alarona, Carrer d'Hernán Cortés, Carrer de Francisco Pizarro, Carrer de Sant Cugat, Carrer de la República, Carrer de la Marató, Carrer del Roselló, and Carrer de la Pau. A yellow dashed line outlines a specific route through the area. A red triangle warning sign with a black silhouette of a person digging is placed on the route. A yellow speech bubble icon is also visible. The map is overlaid with a blue banner at the top reading 'FASE 3 AV. LLUIS COMPANYS (A)' and an orange banner below it reading 'FASE 4 CAMÍ DEL MIG'. A white box on the right side of the map contains the text 'SETMANA 1'. A white box at the bottom right corner contains the text 'L7'.

AFECTACIÓ BUS

FASE 4 CAMÍ DEL MIG (CLAV.)

[illegible]

L1

AFECTACIÓ BUS

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys


SETMANA 25

Zona de treball

Treballs de pavimentació i reposició senyalització

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte de l'aigua i del clavegueram del Camí del Mig, Rd. O'Donnell i Av. Lluís Companys

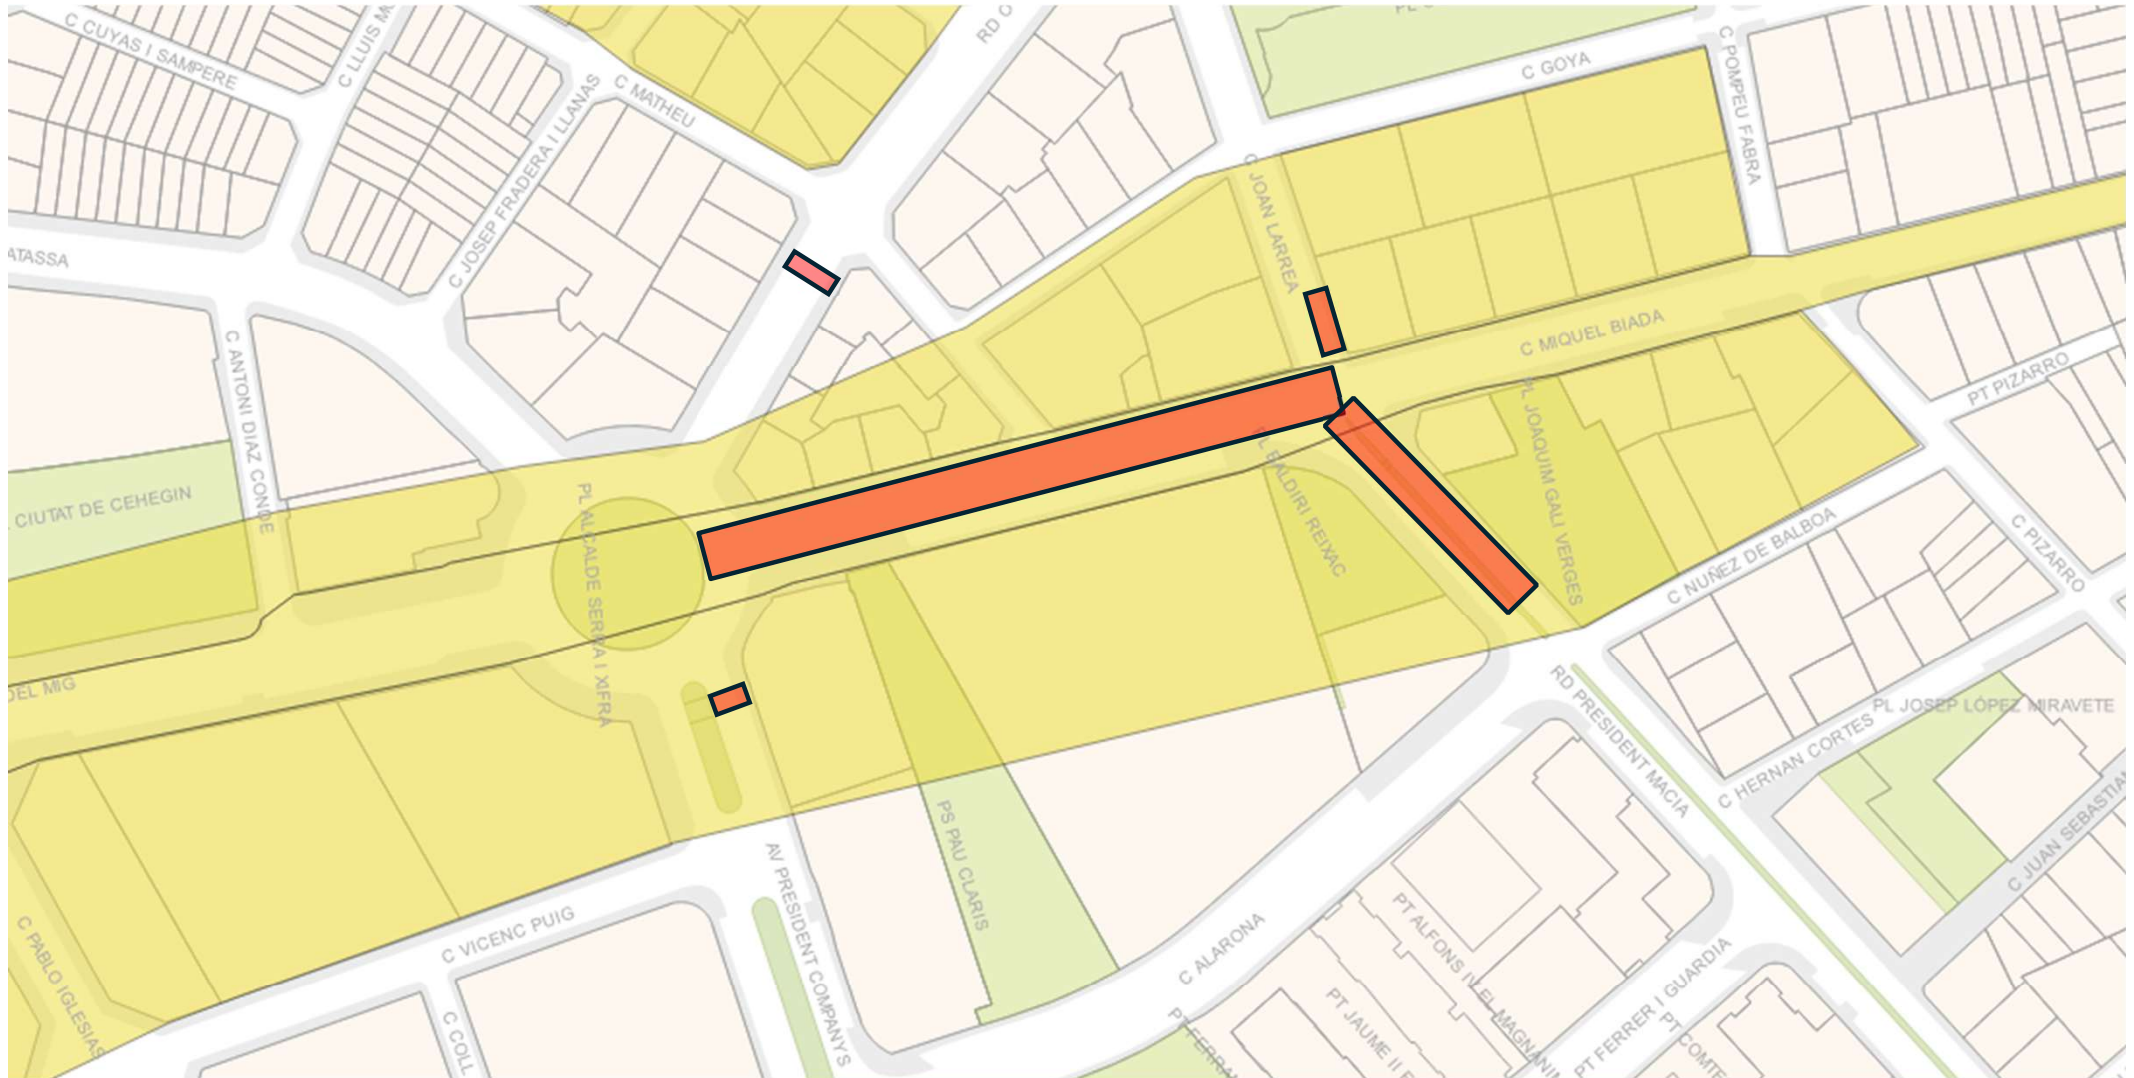

ZONA DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Data inici	4 d'agost de 2025
Termini d'execució	25 setmanes
Import Obra Mecànica Aigua Potable	144.654,54 € (IVA inclòs)
Import adjudicació Obra Civil d'aigua i de clavegueram	1.077.057,68 € (IVA inclòs)
Import total obra	1.221.712,22 € (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària Obra Civil d'aigua i clavegueram	GICSA Empresa constructora

Informació:

www.aiguesmataro.cat

Obres Camí del Mig

comunicacio@aiguesmataro.com



Moltes gràcies

